55 avenue Cedar – PIIA résidentiel – Nouvelle construction

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation,

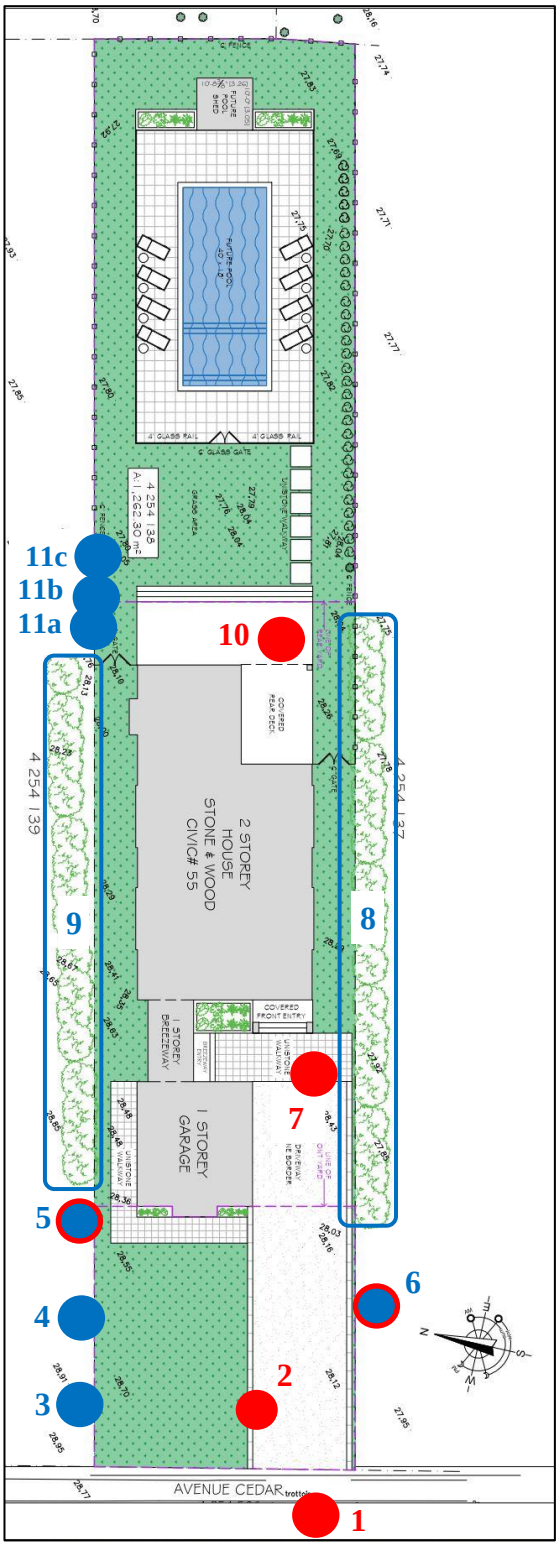

Légende :

- **Abattage projet**
- **Protéger**
- **Protéger dépérissement possible**

3. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation des arbres / Numéro d'arbres	Commentaires
Quatre (4) arbres à abattre	Un (1) érable à sucre public de 5 cm en bonne condition	#1	Situés dans l'implantation de l'entrée charretière projetée.
	Un (1) pommetier de 15 cm en bonne condition	#2	
	Un (1) pommetier de 15 cm en bonne condition	#7	Situé dans l'implantation du trottoir d'entrée en pierre projeté.
	Un (1) pommetier de 21-16 cm en bonne condition	#10	Situé dans l'implantation de la terrasse arrière projetée.
Sept (7) arbres et deux (2) haies à conserver et à protéger	Un (1) érable argenté ~90 cm en bonne condition	#3	Situés dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux. Situés sur la propriété du #57 avenue Cedar.
	Un (1) érable argenté ~90 cm en bonne condition	#4	
	Un (1) érable argenté ~90 cm en bonne condition	#5	Situé à proximité de la zone d'excavation pour le garage projeté. Situé sur la propriété du #57 avenue Cedar.
	Un (1) orme rouge de 33-29 cm en bonne condition	#6	Situé à proximité de la zone d'excavation pour l'entrée charretière projetée. Situé sur la propriété du #53 avenue Cedar.
	Une (1) haie composée principalement de thuyas occidentaux jusqu'à 20 cm en bonne condition	#8	Située à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison et garage projetés. Mitoyenne avec le #53 avenue Cedar.
	Une (1) haie composée principalement de thuyas occidentaux jusqu'à 20 cm en bonne condition	#9	Située à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison et entrée charretière projetées. Mitoyenne avec le #57 avenue Cedar.
	Un (1) érable argenté ~90 cm en bonne condition	#11a	Situés à proximité de la zone d'excavation pour la terrasse arrière projetée. Mitoyens avec le #57 avenue Cedar.
	Un (1) érable argenté ~90 cm en bonne condition	#11b	
	Un (1) érable argenté ~90 cm en bonne condition	#11c	
Trois (3) arbres à planter	– Deux (2) arbres à grand déploiement à planter par le propriétaire. – Un (1) arbre public à planter dans l'emprise municipale par la Ville suite aux travaux.		

4. Photos :

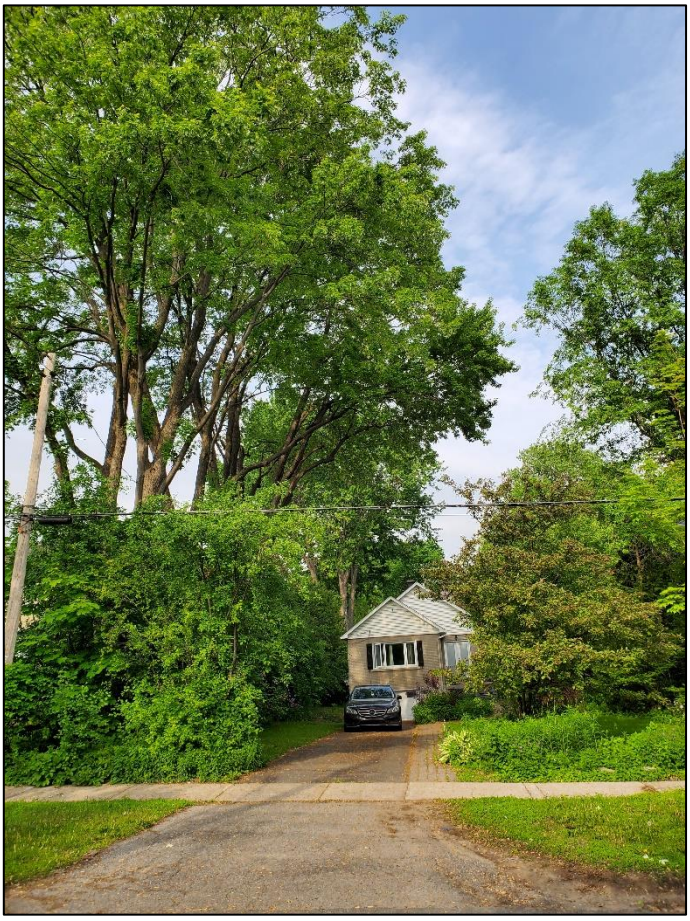

Photo #1 : Vue générale – façade

Photo #2 : Arbre #1

Photo #3 : Arbre #2

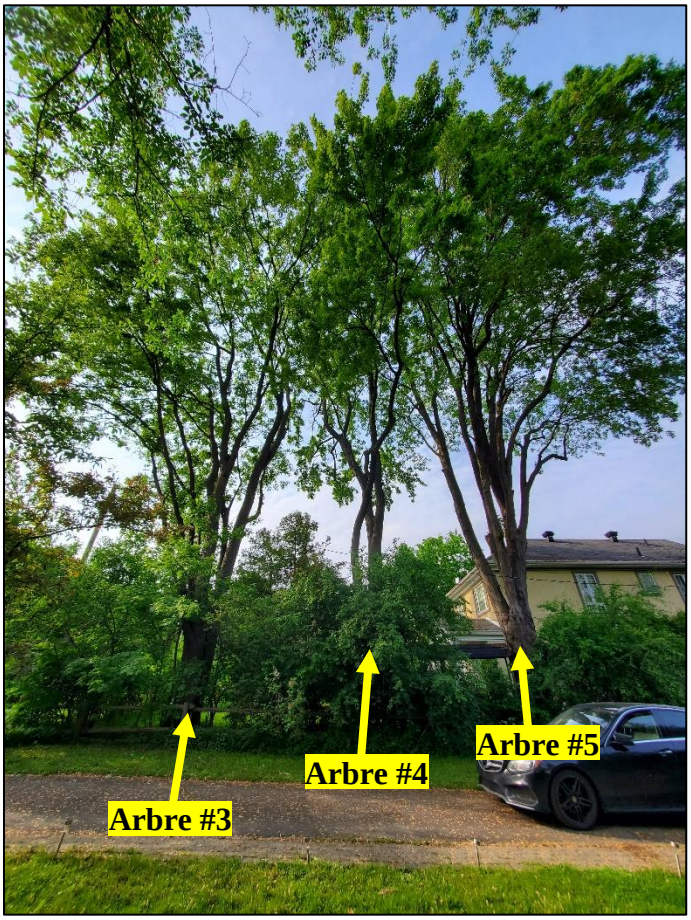

Photo #4 : Arbres #3, 4 et 5

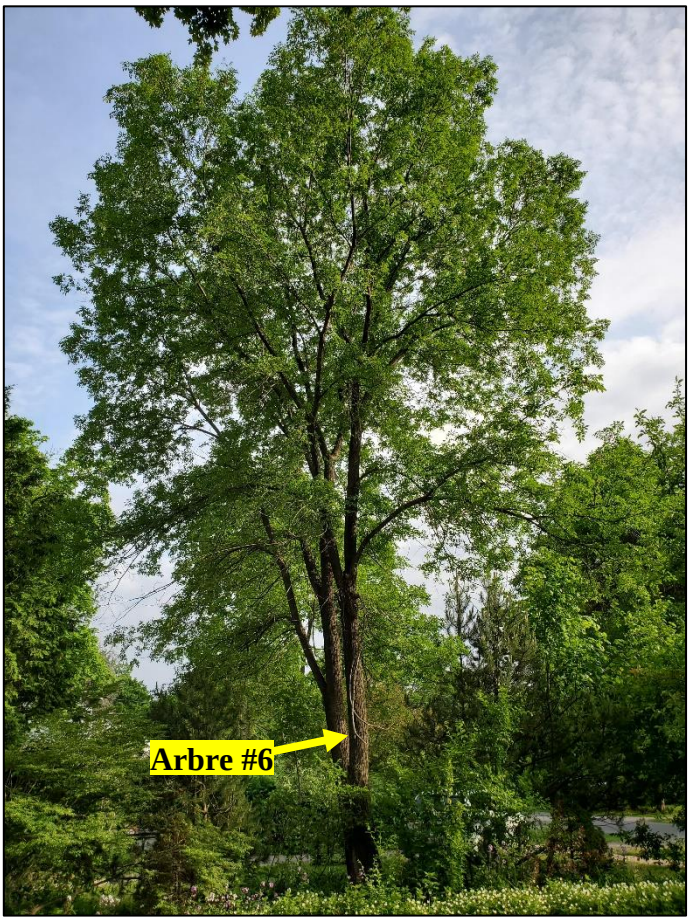

Photo #5 : Arbre #6

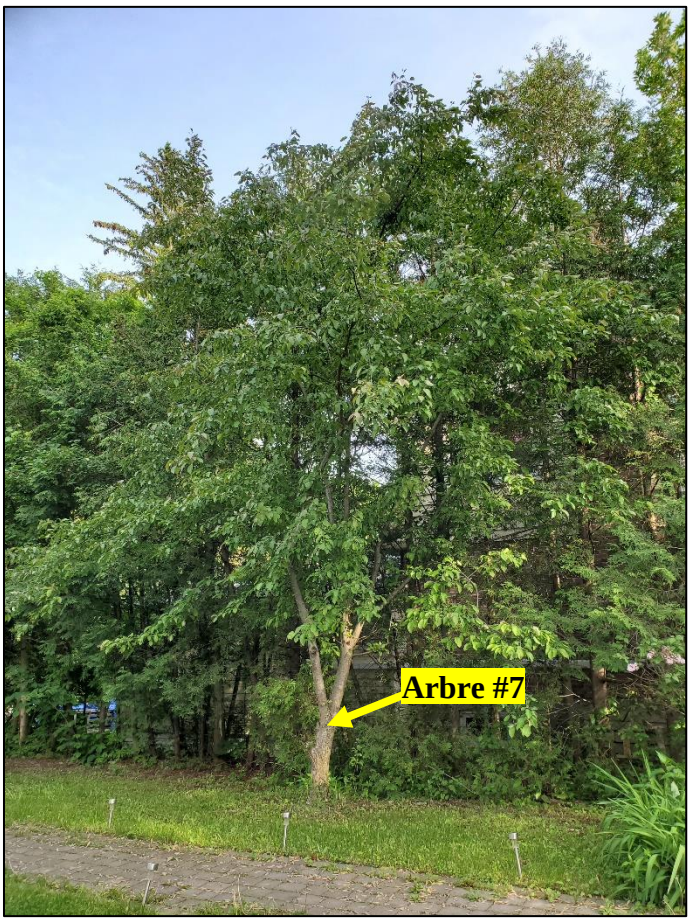

Photo #6 : Arbre #7

Photo #7 : Haie #8

Photo #8 : Haie #9

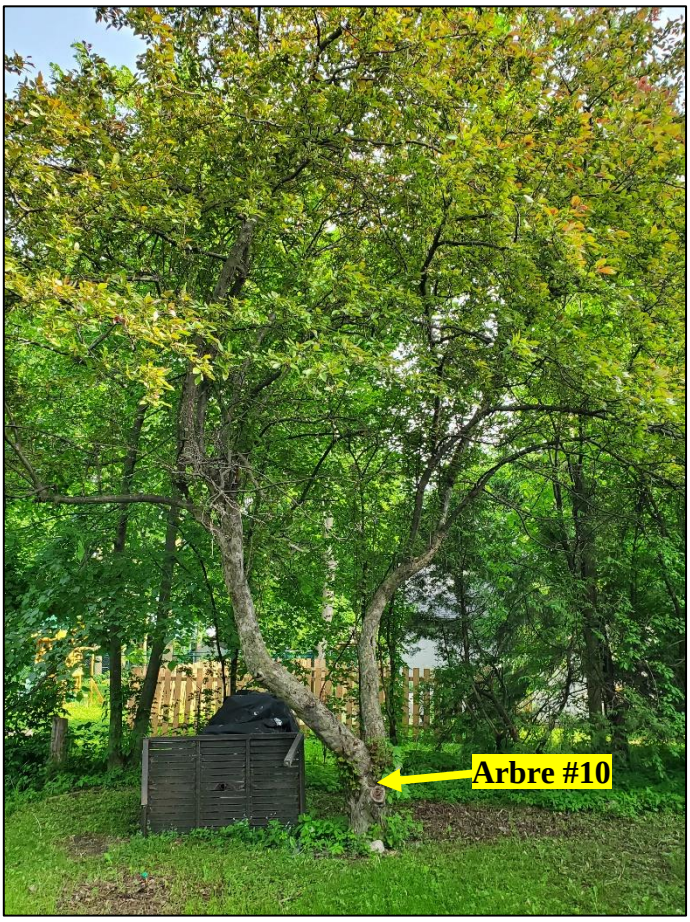

Photo #9 : Arbre #10

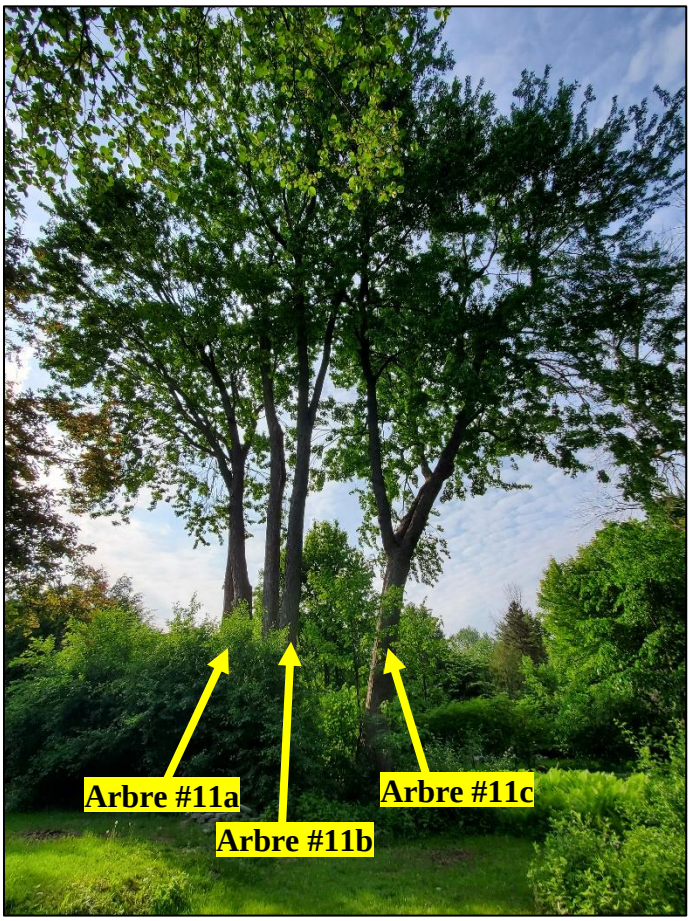

Photo #10 : Arbres #11a-11b-11c
